


CITTA' DI VENARIA REALE

AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DON SAPINO

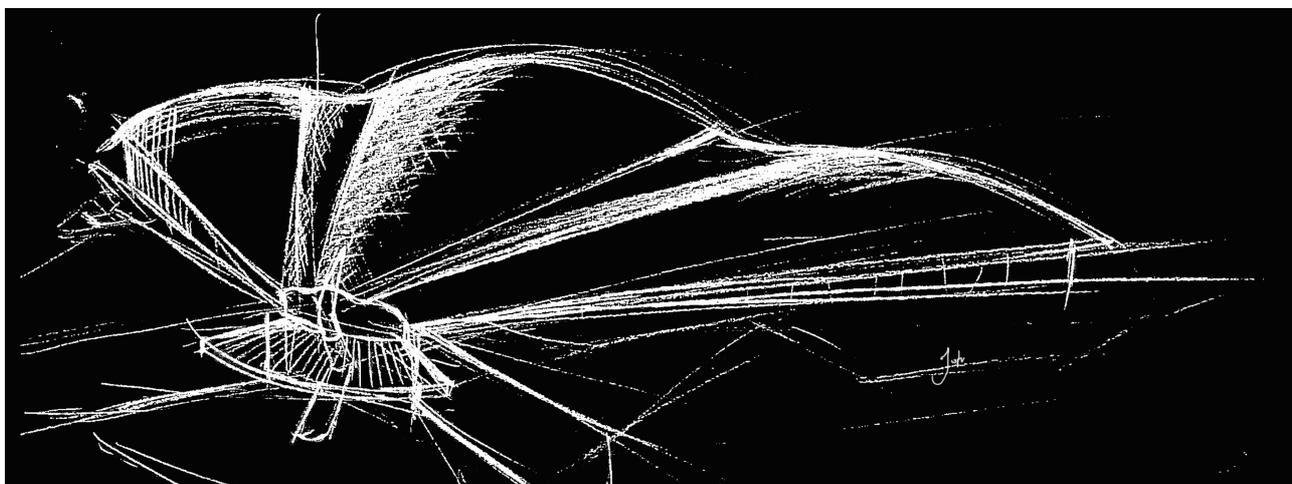

COMMITTENTE

Città di Venaria Reale
Settore Lavori Pubblici
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078
Responsabile Unico di Procedimento: Arch. Sabrina GATTIGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI

Timbri e firme



Via Trottechien 61 - 11100 Aosta
Tel. 011 2730043
mythos.ao@mythos.pro
infoto@tecnicaer.it



CRONOPROGRAMMA

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| Data | Codice elaborato | |
| 08/09/10 | K.WW.E.001 | |
| Scala | File di riferimento | Approvazioni |
| | K.WW.E.001 | 000 |

Timbri e firme

Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

Ing. Fabio INZANI

Direttore operativo opere impiantistiche:

Ing. Stefano BONFANTE

Responsabile integrazione delle prestazioni specialistiche esperto in architettura bioclimatica e con funzioni di coordinatore del progetto:

Ing. Andrea TADDIA

Progettista impianti ad alta efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili di energie, progettista edifici passivi:


Ing. Fabio INZANI

Responsabile della funzione della comunicazione dell'opera:

Ing. Marco VITALI

| Revisione | Data | Descrizione | Emissione | Verifica | Approvazione |
|-----------|------|-------------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | |

| ID | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | 23 ma 23/05 | 30 ma 30/05 | 06 giu 06/06 | 13 giu 13/06 | 20 giu 20/06 | 27 giu 27/06 | 04 lug 04/07 | 11 lug 11/07 | 18 lug 18/07 | 25 lug 25/07 | 01 ago 01/08 | 08 ago 08/08 | 15 ago 15/08 | 22 ago 22/08 | 29 ago 29/08 | 05 set 05/09 | 12 set 12/09 | 19 set 19/09 | 26 set 26/09 | 03 ott 03/10 | 10 ott 10/10 | 17 ott 17/10 | 24 ott 24/10 | |
|----|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | Ampliamento Scuola Materna Via Boccaccio | 300 g | lun 06/06/11 | sab 31/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Consegna lavori | 0 g | lun 06/06/11 | lun 06/06/11 | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Delimitazione aree di cantiere | 3 g | lun 06/06/11 | mer 08/06/11 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Apprestamenti logistici | 10 g | gio 09/06/11 | sab 18/06/11 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Allacciamenti cantiere | 10 g | sab 11/06/11 | lun 20/06/11 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Abbattimento alberi e scotico dell'area | 15 g | mar 21/06/11 | mar 05/07/11 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Scavi di sbancamento | 20 g | mer 29/06/11 | lun 18/07/11 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Demolizioni parziali su corpo di fabbrica esistente | 10 g | dom 26/06/11 | mar 05/07/11 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Rifacimento centrale termica | 45 g | dom 26/06/11 | mar 09/08/11 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Realizzazione fondazioni | 20 g | mar 19/07/11 | dom 07/08/11 | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Realizzazione delle reti impiantistiche esterne | 35 g | mar 19/07/11 | lun 22/08/11 | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Realizzazione delle strutture verticali | 30 g | gio 18/08/11 | ven 16/09/11 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Realizzazione coperture ed impermeabilizzazioni | 45 g | mer 07/09/11 | ven 21/10/11 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Realizzazione solai areati | 25 g | ven 07/10/11 | lun 31/10/11 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Realizzazione dei tamponamenti esterni | 40 g | dom 02/10/11 | gio 10/11/11 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Realizzazione sottofondi | 40 g | sab 22/10/11 | mer 30/11/11 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Realizzazione impianti pannelli radianti | 40 g | mar 01/11/11 | sab 10/12/11 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | Realizzazione distribuzione elettrica principale | 40 g | ven 11/11/11 | mar 20/12/11 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 19 | Realizzazione partizioni interne | 45 g | ven 11/11/11 | dom 25/12/11 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 20 | Rinzaffi ed intonaci | 40 g | ven 11/11/11 | mar 20/12/11 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 21 | Pavimenti e rivestimenti | 50 g | dom 11/12/11 | dom 29/01/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 22 | Impianti terminali di forza motrice | 40 g | gio 05/01/12 | lun 13/02/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 23 | Impianti terminali di illuminazione | 40 g | ven 20/01/12 | mar 28/02/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 24 | Posa in opera sanitari | 30 g | lun 30/01/12 | mar 28/02/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 25 | Termoregolazione | 25 g | mer 29/02/12 | sab 24/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 26 | Serramenti esterni | 75 g | mer 21/12/11 | dom 04/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 27 | Serramentin interni | 45 g | lun 30/01/12 | mer 14/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 28 | Finiture | 17 g | gio 15/03/12 | sab 31/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 29 | Prove di primo impianto | 20 g | sab 10/03/12 | gio 29/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 30 | Fine lavori | 0 g | sab 31/03/12 | sab 31/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

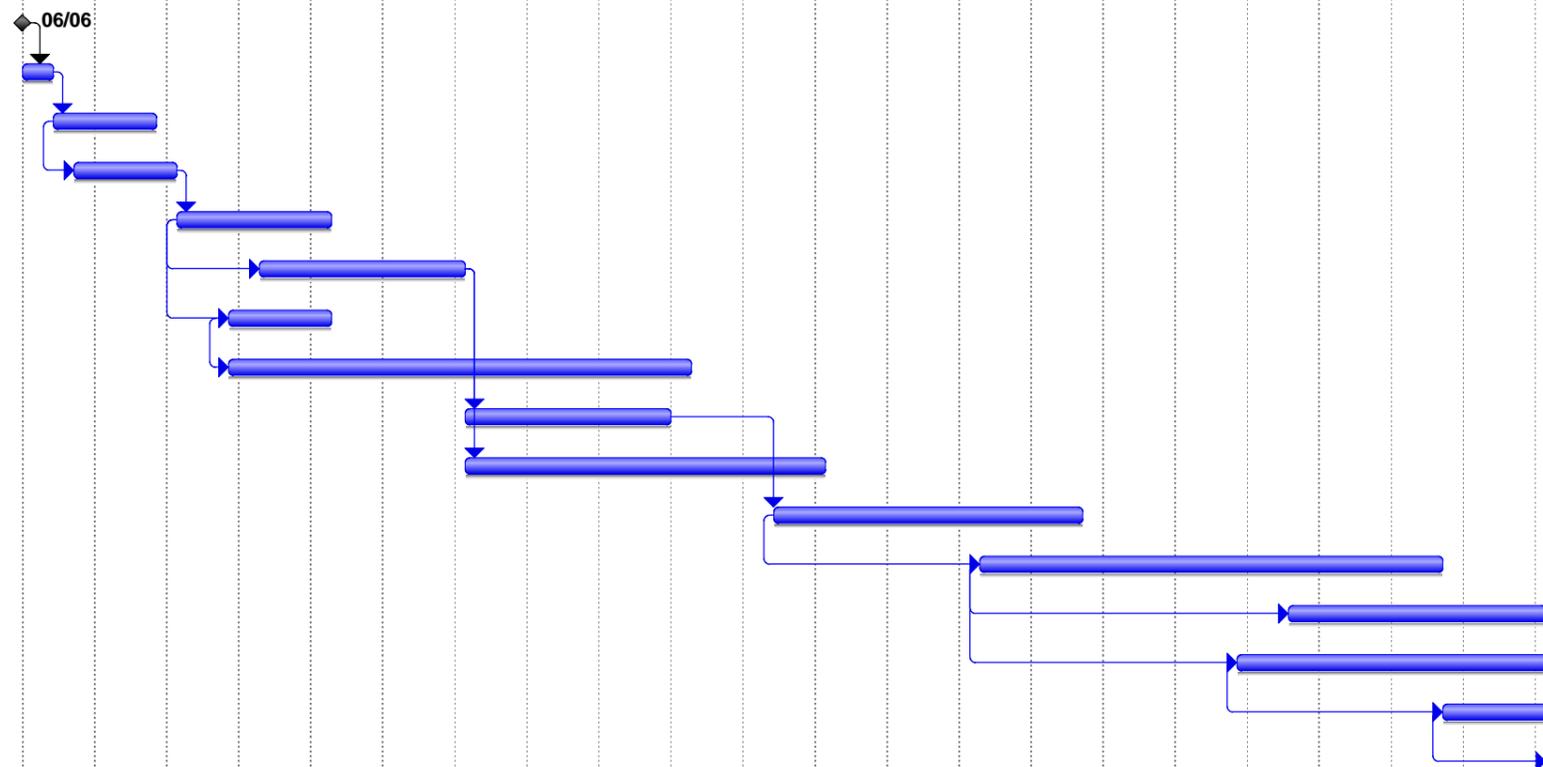

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|---|--------------------|---|------------------|---|----------|---|
| Progetto: | Attività | ■ | Avanzamento | ▬ | Riepilogo | ▬ | Attività esterne | ■ | Scadenza | ↓ |
| Data: | Divisione | ⋯ | Cardine | ◆ | Riepilogo progetto | ▬ | Cardine esterno | ◆ | | |

| ID | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | 31 ott | 07 nov | 14 nov | 21 nov | 28 nov | 05 dic | 12 dic | 19 dic | 26 dic | 02 gen | 09 gen | 16 gen | 23 gen | 30 gen | 06 feb | 13 feb | 20 feb | 27 feb | 05 mar | 12 mar | 19 mar | 26 mar | 02 apr |
|----|---|--------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 |
| 1 | Ampliamento Scuola Materna Via Boccaccio | 300 g | lun 06/06/11 | sab 31/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Consegna lavori | 0 g | lun 06/06/11 | lun 06/06/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Delimitazione aree di cantiere | 3 g | lun 06/06/11 | mer 08/06/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Apprestamenti logistici | 10 g | gio 09/06/11 | sab 18/06/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Allacciamenti cantiere | 10 g | sab 11/06/11 | lun 20/06/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Abbattimento alberi e scotico dell'area | 15 g | mar 21/06/11 | mar 05/07/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Scavi di sbancamento | 20 g | mer 29/06/11 | lun 18/07/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Demolizioni parziali su corpo di fabbrica esistente | 10 g | dom 26/06/11 | mar 05/07/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Rifacimento centrale termica | 45 g | dom 26/06/11 | mar 09/08/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Realizzazione fondazioni | 20 g | mar 19/07/11 | dom 07/08/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Realizzazione delle reti impiantistiche esterne | 35 g | mar 19/07/11 | lun 22/08/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Realizzazione delle strutture verticali | 30 g | gio 18/08/11 | ven 16/09/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Realizzazione coperture ed impermeabilizzazioni | 45 g | mer 07/09/11 | ven 21/10/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Realizzazione solai areati | 25 g | ven 07/10/11 | lun 31/10/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Realizzazione dei tamponamenti esterni | 40 g | dom 02/10/11 | gio 10/11/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Realizzazione sottofondi | 40 g | sab 22/10/11 | mer 30/11/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Realizzazione impianti pannelli radianti | 40 g | mar 01/11/11 | sab 10/12/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Realizzazione distribuzione elettrica principale | 40 g | ven 11/11/11 | mar 20/12/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Realizzazione partizioni interne | 45 g | ven 11/11/11 | dom 25/12/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Rinzaffi ed intonaci | 40 g | ven 11/11/11 | mar 20/12/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pavimenti e rivestimenti | 50 g | dom 11/12/11 | dom 29/01/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Impianti terminali di forza motrice | 40 g | gio 05/01/12 | lun 13/02/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Impianti terminali di illuminazione | 40 g | ven 20/01/12 | mar 28/02/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Posa in opera sanitari | 30 g | lun 30/01/12 | mar 28/02/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Termoregolazione | 25 g | mer 29/02/12 | sab 24/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Serramenti esterni | 75 g | mer 21/12/11 | dom 04/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Serramentin interni | 45 g | lun 30/01/12 | mer 14/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Finiture | 17 g | gio 15/03/12 | sab 31/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Prove di primo impianto | 20 g | sab 10/03/12 | gio 29/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Fine lavori | 0 g | sab 31/03/12 | sab 31/03/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Progetto:
 Attività
 Avanzamento
 Riepilogo
 Attività esterne
 Scadenza ↕
 Data:
 Divisione
 Cardine
 Riepilogo progetto
 Cardine esterno
